

INFORME DE GESTIÓN

SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ
GERENTE GENERAL

20
25

SEP - DIC

An aerial photograph of a small, lush green island situated in a body of water. On the island, there is a building with a bright blue roof. A small boat is visible in the water near the island. The background is a dark, calm body of water.

24

**METAS DE
PRODUCTO**

**RESULTADOS Y AVANCES
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
DE BARRANCABERMEJA**

2024 -2027

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL



META CUATRIENIO: Construir 1000 metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en el casco urbano incluyendo áreas de difícil gestión



Estado: **META
CUMPLIDA 100%**

2463,2 m

**METROS LINEALES
ALCANTARILLADOS
CONSTRUIDOS**

SECTORES INTERVENIDOS

Construcción Tramos de Alcantarillado Pluvial en el Barrio Yarima - Sector Torres Flotantes del Barrio El Parnaso – **Barrios Yuma y Brisas de la Paz** - Descole Pluvial en la Transversal 50 con Diagonal 57a del Barrio Danubio - Descole Pluvial en la Carrera 62 entre Calles 38 y 39 Barrio Colinas del Campestre.

RECURSOS INVERTIDOS

\$ 2.065.540.030 Aguas de Barrancabermeja SA ESP
\$ 831.408.717 Distrito de Barrancabermeja

Nota: En la vigencia 2026 se inicia el proyecto en un sector del Barrio La Esperanza



POBLACIÓN
BENEFICIADA

3.109
HABITANTES



OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

ANTES



AVANCE OBRA:

100%

DESPUÉS



Estado: **META CUMPLIDA 100%**

1053,82 m

METROS LINEALES OPTIMIZADOS

SECTORES INTERVENIDOS

Barrios Los Pinos – Aguas Claras – La Libertad – Chicó – Santa Isabel – Floresta Baja – Barrio Campestre – Barrio Colombia.

RECURSOS INVERTIDOS

\$ 4.114.798.536 Aguas de Barrancabermeja SA ESP

Nota: En la vigencia 2026 se inician los proyectos en los Barrios Jerusalén y Pomarroso



POBLACIÓN BENEFICIADA

5.020 HABITANTES

META CUATRIENIO: Optimizar 1000 metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en el casco urbano

aguas
de Barrancabermeja
S.A. E.S.P

OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO URBANO



984,83 m

METROS LINEALES
ACUEDUCTO OPTIMIZADOS

Contrato de Obra No. 88 de 2025: Rehabilitación redes de acueducto de AC por PVC localizadas en Calle 52 entre Cra 4/11, Cra 6 entre las Calles 52/49 y Calle 49 entre Carrera 6/8 Sector Comercial, Comuna I del Distrito de Barrancabermeja, Fase 1. - Código POIR AB046 2

Valor Programado: **\$2.296.519.628**

Valor Ejecutado: **\$862.845.155**

Contrato de Interventoría No. 87 de 2025: Interventoría Técnica Socioambiental, Administrativa y Financiera para la Rehabilitación redes de acueducto de AC por PVC localizadas en Calle 52 entre Cra 4/11, Cra 6 entre las Calles 52/49 y Calle 49 entre Carrera 6/8 Sector Comercial, comuna I del Distrito de Barrancabermeja, Fase 1. - Código POIR AB046 2

Valor Programado: **\$168.974.309**

Valor Ejecutado: **\$ 63.483.647**



POBLACIÓN
BENEFICIADA

63.753
HABITANTES

META CUATRIENIO: Optimizar 1000 metros lineales de redes de acueducto urbano del Distrito de Barrancabermeja



OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO



ALCANCE:

621,24 metros lineales de Acueducto

935,18 metros lineales Alcantarillado

META CUATRIENIO: Optimizar 1000 metros lineales de redes de acueducto urbano del Distrito de Barrancabermeja

META CUATRIENIO: Optimizar 1000 metros lineales de redes de alcantarillado pluvial y sanitario urbano del Distrito de Barrancabermeja

REHABILITACIÓN ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
PLUVIAL Y SANITARIO Y OBRAS DE URBANISMO EN EL
BARRIO POMARROSO DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA -ABAL039-ABO89

VALOR CONTRATADO

\$2.655.426.300

RECURSOS PROPIOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

AVANCE: **SOCIALIZACION - POR INICIAR OBRA**



POBLACIÓN
BENEFICIADA

1.200
HABITANTES



CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO URBANO



663,5m

METROS LINEALES
ACUEDUCTO CONSTRUIDOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2001 DE 2025 Aunar Esfuerzos entre el Distrito de Barrancabermeja y la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP para la Construcción Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario **Barrio Yuma y Brisas de la Paz**, Comuna Tres del Distrito de Barrancabermeja.

Contrato de Obra No. 098 de 2025 Construcción Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario Barrio Yuma y Brisas de la Paz, Comuna Tres del Distrito de Barrancabermeja.

Valor Programado Acueducto: **\$ 2.011.793.121**

Valor Ejecutado Acueducto: **\$709.279.796**

Contrato de Interventoría No. 097 de 2025 Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Financiera y Jurídica para la Construcción Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario Barrio Yuma y Brisas de la Paz, Comuna Tres del Distrito de Barrancabermeja.

Valor Programado: **\$ 199.866.703**

Valor Ejecutado Acueducto: **\$ 28.007.180**

META CUATRIENIO: Construir 1000 metros lineales de redes de acueducto urbano del Distrito de Barrancabermeja incluyendo áreas de difícil gestión



POBLACIÓN
BENEFICIADA

1.256
HABITANTES

aguas
de Barrancabermeja
S.A. E.S.P.

OPTIMIZACIÓN DE LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO URBANO ENMARCADO EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA



Estado: **META CUMPLIDA 100%**

Rehabilitación línea de media tensión planta de tratamiento - bocatoma fase 3 - adecuación de medición interna de 34500 va con nuevos cts y pts variador de frecuencia y arreglos según norma.



POBLACIÓN
BENEFICIADA

217.742
HABITANTES

**RECURSOS
INVERTIDOS**

\$942.870.951

Aguas de Barrancabermeja SA ESP

aguas
de Barrancabermeja
S.A. E.S.P



AVANCE OBRA:

100%

META CUATRIENIO: Optimizar la bocatoma del acueducto urbano enmarcado en la eficiencia energética

OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP DEL ACUEDUCTO URBANO ENMARCADO EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA



AVANCE OBRA

100%

TANQUE DE CONTACTO DE CLORO

RECURSOS
INVERTIDOS

\$8.992.594.088

SISTEMA GENERAL REGALIAS
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
AGUAS DE BARRANCABERMEJA



ESTADO: SUSPENDIDO

AVANCE: 85,77%

PLANTA DE LODOS

VALOR DEL
PROYECTO

\$ 32.455.715.165

ECOPETROL – AGUAS DE BARRANCABERMEJA
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

93%

AVANCE DE
OPTIMIZACIÓN DE LA
PTAP



POBLACIÓN
BENEFICIADA

217.742
HABITANTES

META CUATRIENIO: Optimizar la planta de tratamiento de agua potable del acueducto urbano enmarcado en la eficiencia energética



CONSTRUCCIÓN PROYECTO PTAR SAN SILVESTRE



AVANCE OBRA:

64,57%

META CUATRIENIO: Gestionar la terminación del proyecto PTAR San Silvestre

VALOR OBRA: **\$169.998.275.832,80**
Valor Ejecutado: **\$ 99.046.006.557,16**

VALOR INTERVENTORIA: **\$14.605.146.148**
Valor Ejecutado: **\$14.597.043.689**



POBLACIÓN
BENEFICIADA

217.742
HABITANTES

VALOR INTERVENTORIA : **\$3.405.816.961**

El Contrato de Obra fue reiniciado en Noviembre de 2025.

En Octubre de 2025, se suscribió el Contrato de Consultoría No. 103 de 2025 "Interventoría Integral al Contrato de Obra Pública No. 134 de 2016 cuyo objeto es Diseño Definitivo, Construcción, Suministro de Equipos Electromecánicos, Puesta en Marcha, Pre-Operación, Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre. Convenio de Colaboración No. DHS 157-09 de Ecopetrol y No. 999-00 del Municipio de Barrancabermeja"



MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN MINIPTARS



MiniPTAR
EL BOSTÓN

AVANCE OBRA:

100%

META CUATRIENIO: Optimizar y mantener las miniPTARs existentes en el Casco Urbano de Distrito de Barrancabermeja – 18 miniPTARs Urbanas – 6 miniPTARs Rurales – 1 PTAP Rural

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0424 de 2025

Aunar esfuerzos entre el Distrito de Barrancabermeja y la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP para el Mantenimiento y Operación de las miniPTARs Urbanas y de las miniPTARs y PTAP Rurales del Distrito 2025 Barrancabermeja.

Contrato de Obra No. 029 de 2025 - Mantenimiento y Operación de las miniPTARs urbanas y de las miniPTARs y PTAP rurales del Distrito de Barrancabermeja, Vigencia 2025, Convenio Interadministrativo No. 0424 de 2025

Valor Contratado: \$ 9.220.753.631

Valor Ejecutado: \$ 9.206.225.277

Contrato de Interventoría No. 033 de 2025 - Interventoría Técnica, Administrativa para el Mantenimiento y Operación de las miniPTARs Urbanas y de las miniPTARs y PTAP rurales del Distrito 2025 Barrancabermeja, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 424 de 2025



POBLACIÓN
BENEFICIADA

17.141
HABITANTES

Valor Contratado: \$ 639.742.017

Valor Ejecutado: \$ 639.742.017



CONSTRUCCIÓN COLECTOR Y ESTACIÓN DE BOMBEO PARA LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO



CONSTRUCCIÓN COLECTOR PARAISO CON ESTACIÓN DE BOMBEO

RECURSOS
INVERTIDOS

\$13.304.268.275,72

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA



CONSTRUCCIÓN COLECTOR COVIBA CON ESTACIÓN DE BOMBEO

RECURSOS
INVERTIDOS


\$ 2.356.562.473

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

METAS CUATRIENIO: Construir 1 colector de alcantarillado sanitario + Construir 1 estación de bombeo para los colectores de alcantarillado sanitario en el casco urbano del Distrito de Barrancabermeja



SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO & ALCANTARILLADO

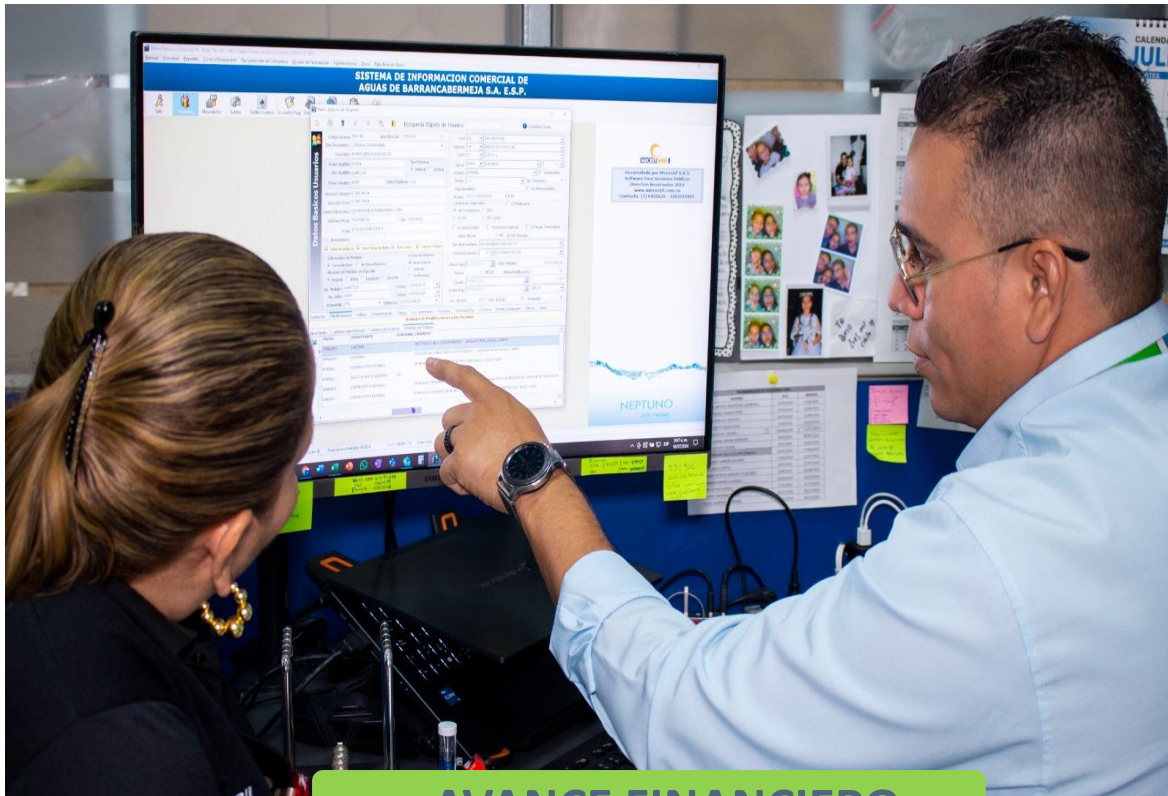

AVANCE FINANCIERO

95,70%

META CUATRIENIO: Subsidiar al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, el servicio de acueducto y alcantarillado, en los términos de lo establecido en la Ley 142 de 1994

Convenio Interadministrativo No. 0479 de 2025 para la Transferencia de los Aportes al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos y Subsidios Complementarios para el Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado a los Estratos 1 y 2 en el Perímetro Urbano del Distrito de Barrancabermeja.

VALOR DEL CONTRATO **\$ 15.146.690.912**

VALOR EJECUTADO **\$14.495.805.206**



USUARIOS BENEFICIADOS

45.445 Acueducto

35.940 Alcantarillado

70%

PORCENTAJE DE SUBSIDIOS
PARA CARGO FIJO Y CONSUMO
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Usuarios Estrato 1

40%

PORCENTAJE DE SUBSIDIOS
PARA CARGO FIJO Y CONSUMO
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Usuarios Estrato 2



GARANTIZAR EL MINIMO VITAL



El Acuerdo No. 033 del 28 de Diciembre de 2025 “Por medio del cual se establece el porcentaje de subsidios y contribuciones en acueducto, alcantarillado y aseo con destino al Fondo cuenta de Solidaridad y Redistribución del Ingreso para la Vigencia 2026, establece en su artículo 3 que “La Administración Distrital a partir de la vigencia 2026 mediante acto administrativo implementará el **Decreto Nacional No. 776 del 7 de Julio de 2025**”, relacionado este con el Mínimo Vital.

META CUATRIENIO: Garantizar, durante el cuatrienio el mínimo vital de agua potable al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3.



CONSTRUIR ANILLO HIDRAULICO SECTOR URBANO



EN GESTIÓN DE RECURSOS ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Proyecto: Construcción de la Red Matriz (Anillo Hidráulico) para la Optimización del Sector Hidráulico Sur del Sistema de Acueducto Urbano del Distrito, Fase I Barrancabermeja.

BPPID: 20250680810044

BPIN: 20250000004444

Valor: \$ 14.362.733.910

Proyecto viabilizado por el Distrito



POBLACIÓN
BENEFICIADA

217.742
HABITANTES

META CUATRIENIO: Construir una red de mil quinientos (1500) metros lineales de anillo hidráulico en el casco urbano del Distrito de Barrancabermeja

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA			
	CERTIFICACION DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION			
	Código: DEP-FO-025	Fecha:05/12/2023	Versión: 001	Página: 1 de 1

CERTIFICA:

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA 2024-2027		
Nombre del Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE LA RED MATRIZ (ANILLO HIDRAULICO) PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SECTOR HIDRÁULICO SUR DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL DISTRITO. FASE I BARRANCABERMEJA.	
Número BPPID	20250680810044	
Línea Estratégica Distrital	Empleo y Derechos de Todos	
Sector de inversión territorial	Vivienda, Ciudad y Territorio	
Programa Distrital	4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	
Indicador de producto plan de desarrollo	400301603 Red de distribución ampliada	
Número BPIN	202500000024444	
Programa Nacional	4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	
Producto Nacional	4003016 Acueductos Ampliados	
Indicador Nacional	400301603 Red de distribución ampliada	
Valor Total del Proyecto	\$14.362.733.910	
Valor Total de la Vigencia	\$14.362.733.910	
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS		
Vigencia Actual	Vigencia Futura (Ordinaria) 20##	Vigencia Futura (Excepcional) 20##
Obra: \$12.988.198.021	Obra:	Obra:
Interventoría: \$965.608.382	Interventoría:	Interventoría:
Otros: \$408.927.507	Otros:	Otros
Total: \$14.362.733.910	Total:	Total:
Solicitud realizada por:	Nombre: SANDRA PAOLA LEON DIAZ CARGO: Gerente General Aguas de Barrancabermeja.	
Nota: REGISTRO 2025. PARA GESTIÓN DE RECURSOS- NO APTO PARA CONTRATACIÓN.		

Se expide en Barrancabermeja a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025) y tiene validez hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

LAURA VANESSA RANGEL ACOSTA
Directora de Planeación Institucional
Secretaría de Planeación Distrital

aguas
de Barrancabermeja
S.A. E.S.P.

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MICROMEDICIÓN



5960

MICROMEDIDORES
INSTALADOS

Desde Enero – Diciembre 2025

MEDIDORES RESIDENCIALES	MEDIDORES NO RESIDENCIALES	MEDIDORES OFICIALES
5437	506	17

ÍNDICE DE MICROMEDICIÓN
EFECTIVA – IMI.

CORTE A DICIEMBRE 2025

86,13 %

NOTA: Actualmente se ejecutan dos proyectos de construcción y/o rehabilitación de redes de acueducto y contemplan la instalación de medidores así: Barrios Yuma y Brisas de la Paz (456 medidores) – Barrio Pomaroso (110 medidores)

META CUATRIENIO: Implementar un Programa de Micromedición para 3.000 Usuarios del Casco Urbano pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Distrito de Barrancabermeja

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA		
	CERTIFICACION DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION		
	Código: DEP-FO-025	Fecha:09/12/2023	Versión: 001
	Página: 1 de 1		

CERTIFICA:

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA 2024-2027			
Nombre del Proyecto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES A LOS USUARIOS DE ESTRATOS 1,2 Y 3 EN EL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
Número BPPID	20250680810050		
Línea Estratégica Distrital	Empleo y Derechos de Todos		
Sector de inversión territorial	Vivienda, Ciudad y Territorio		
Programa Distrital	4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico		
Indicador de producto plan de desarrollo	400300900 Usuarios conectados a la red de servicios de acueducto.		
Número BPIN	202500000025505		
Programa Nacional	4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico		
Producto Nacional	4003009 Servicio de acueducto		
Indicador Nacional	400300900 Usuarios conectados a la red de servicios de acueducto.		
Valor Total del Proyecto	\$10.957.909.577		
Valor Total de la Vigencia	\$10.957.909.577		
DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS			
Vigencia Actual	Vigencia Futura (Ordinaria) 20##		Vigencia Futura (Excepcional) 20##
Obra: \$10.281.464.553	Obra:		Obra:
Interventoria: \$676.455.024	Interventoria:		Interventoria:
Otros:	Otros:		Otros:
Total: \$10.957.909.577	Total:		Total:
Solicitud realizada por:	Nombre: SANDRA PAOLA LEON DIAZ CARGO: Gerente General Aguas de Barrancabermeja.		
Nota: REGISTRO 2025. PARA GESTIÓN DE RECURSOS- NO APTO PARA CONTRATACIÓN.			

Se expide en Barrancabermeja a los diez (10) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025) y tiene validez hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

LAURA VANESSA RANGEL ACOSTA
Directora de Planeación Institucional
Secretaría de Planeación Distrital

aguas
de Barrancabermeja
S.A. E.S.P.

FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA GESTIÓN DE RECURSOS



Proyecto: Diseño, Suministro e Instalación de Equipos y Adecuación Obras Civiles y Eléctricas para la Puesta en Marcha y Operación del Laboratorio de Pruebas de Medidores de Agua Potable en la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

Valor: \$2.352.744.277

En trámite ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital para Viabilización.



Proyecto: Actualización Catastro de Redes de Acueducto y Alcantarillado de Implementación de Modelo Hidráulico Comuna 1 y 2 del Distrito de Barrancabermeja se presentó al Banco de Proyectos de Inversión Distrital

Valor: \$2.331.872.727

En trámite ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital para Viabilización.

META CUATRIENIO: Gestionar la Dotación de un (1) Equipo de Calibración para el Laboratorio de Metrología del Acueducto Urbano del Distrito de Barrancabermeja

META CUATRIENIO: Realizar una (1) consultoría para la Actualización del Catastro de Redes de Acueducto y Alcantarillado en el Casco Urbano del Distrito de Barrancabermeja

FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA GESTIÓN DE RECURSOS



Proyecto: Dotación de Equipo para la Operación y Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado en el Distrito de Barrancabermeja

Valor: \$ 2.682.569.480

Por iniciar Tramite ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital para Viabilización.

META CUATRIENIO: Gestionar la dotación de un (1) equipo succión presión para el saneamiento básico del Distrito de Barrancabermeja

PROYECTOS QUE ESTAN PROGRAMADOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 - 2027

2026 - 2027

META CUATRIENIO: Realizar una (1) Consultoría del Plan Maestro de Acueducto en el Casco Urbano del Distrito de Barrancabermeja

2027

META CUATRIENIO: Realizar 1 acción para implementar el resultado del estudio de la fuente alterna mediante la presentación del proyecto para gestionar recursos en diferentes entes cofinanciadores del orden nacional, departamental y distrital.



Avance de las 24 Metas de Producto: Plan de Desarrollo Distrital de Barrancabermeja



Redes de Acueducto y Alcantarillado



✓ 1 de 1 obra conexa para colectores construida



Banco de Proyectos de Inversión Distrital

6 Proyectos

✓ Viabilizados (2)

- Red Matriz (Anillo Hidráulico Sur Fase I)
- Micromedidores para estratos 1, 2 y 3 (Casco urbano)



En Trámite (4)

- Laboratorio Pruebas de Medidores de Agua
- Catastro de Redes y Modelo Hidráulico (Comuna 1 y 2)
- Dotación de Equipo (Operación alcantarillado)
- Optimización Colector y Estación Bombeo Comercio



Infraestructura, Saneamiento y Eficiencia



Eficiencia Energética
Bocatoma



Eficiencia Energética
PTAP




Ejecución PTAR
San Silvestre



100% Operación miniPTARs

- 18 Urbanas
- 6 Rurales
- 1 PTAP Rural

Avance Colectores




Impacto Social y Visión 2026-2027



Impacto Social

- 100% Subsidios entregados a estratos 1, 2
- Mínimo Vital asegurado (Acuerdo No. 033 de 2025)



AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

Dimensiones Empresariales






EFFECTIVIDAD OPERATIVA




FUENTE DE CAPTACIÓN CIENAGA SAN SILVESTRE


Volumen captado (millones de m³)



Volumen producido (millones de m³)



% pérdida operacional



OPTIMIZACIÓN Y CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS



INDICADOR	TENDENCIA	OBSERVACIÓN
Agua Tratada	 Descenso	Se trataron 1,86 millones de m3 menos en 2025.
Consumo de Químicos	 Eficiente	Se redujo el consumo total de 3,3M a 2,5M de Kg.
Eficiencia de Dosificación	 Excelente	Se optimizó el uso de insumos en un 20,38%.
Costo por Metro Cúbico	 Crítico	Subió un 24,17% debido netamente a factores de precio.

PERIODO	Consumo Químicos (Kg)	Agua tratada (m3)	Relación Consumo químicos/ Agua tratada (Kg/m3)	VARIACIÓN
ENERO - DIC 2024	3.356.813	29.619.744	0,113	-20,38%
ENERO - DIC 2025	2.503.918	27.750.073	0,090	

PERIODO	Costo Químicos (\$ Pesos)	Agua tratada (m3)	Relación Costo químicos/ Agua tratada (Kg/m3)	VARIACIÓN
ENERO - DIC 2024	\$ 3.773.588.666,00	29.619.744	127,40	24,17%
ENERO - DIC 2025	\$ 4.389.887.857,00	27.750.073	158,19	


OPTIMIZACIÓN Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA



PERIODO	Consumo (kWh)	Agua tratada (m3)	Relación Consumo energía/ Agua tratada (kWh/m3)	VARIACIÓN (Incremento)
ENERO - DIC 2024	13.960.399	29.619.744	0,471	5,00%
ENERO - DIC 2025	13.733.695	27.750.073	0,495	

PERIODO	Costo Energía (\$ Pesos)	Agua tratada (m3)	Relación Costo energía/ Agua tratada (kWh/m3)	VARIACIÓN (Incremento)
ENERO - DIC 2024	10.304.635.560	29.619.744	347,90	-1,26%
ENERO - DIC 2025	9.532.323.963	27.750.073	343,51	

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA IRCA – MUESTRAS DE CONTROL

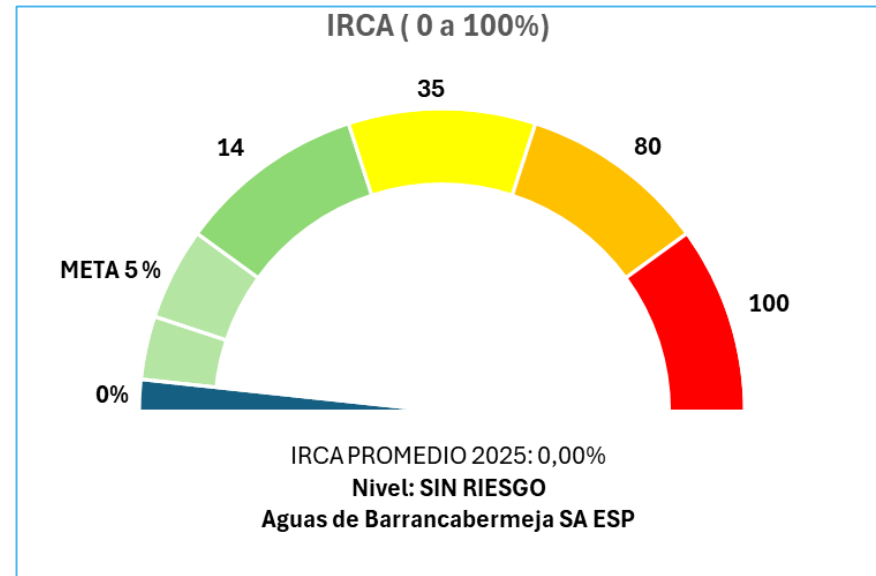

	Rango (%)	Nivel IRCA
	0-5%	SIN RIESGO
	>5 - 14%	BAJO
	>14 - 35%	MEDIO
	>35 - 80%	ALTO
	>80 - 100%	INVIABLE

20

PUNTOS CONCERTADOS
CON SECRETARIA LOCAL
DE SALUD

El IRCA consolidado para el periodo es

SIN RIESGO - Menor a 5%



OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA SUMIDERO



LOS LAGOS

AVANCE OBRA:

100%

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA – FASE 10 - ETAPA II

VALOR EJECUTADO: \$599.835.591

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA POZO DE INSPECCIÓN



SAN JUDAS

AVANCE OBRA:

100%

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA – FASE 10 - ETAPA III

VALOR EJECUTADO: \$ 199.139.847

RECURSOS PROPIOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

MANTENIMIENTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

VALOR CONTRATADO: \$ 1.000.000.000

VALOR EJECUTADO: \$ 886.433.285

RECURSOS PROPIOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA




AVANCE OBRA:

88,64%

ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS POR CASOS FORTUITO EN REDES DE ACUEDUCTO y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO

MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO CON EQUIPO SUCCIÓN PRESIÓN

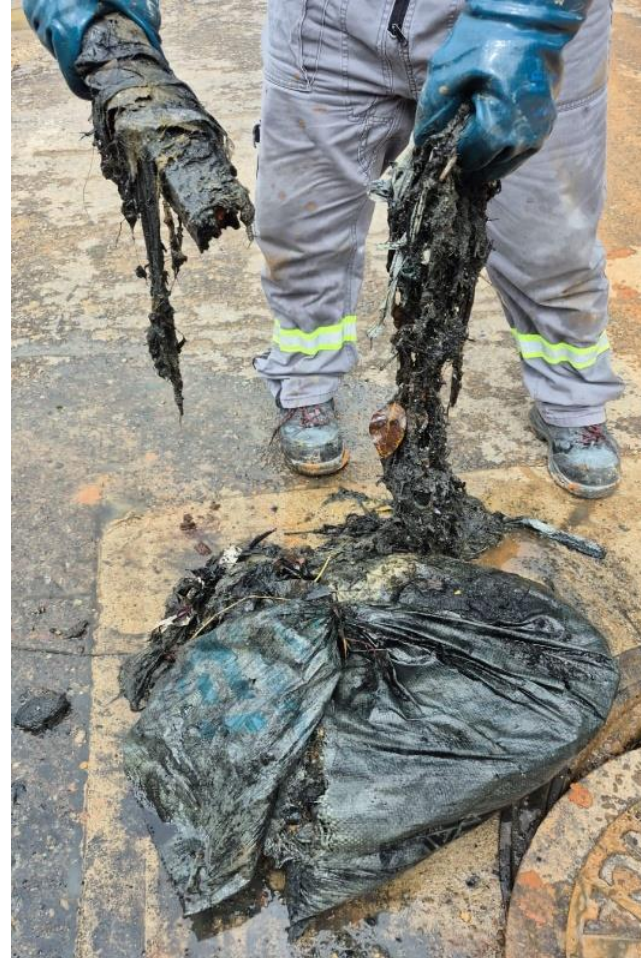

MANTENIMIENTOS DE ALCANTARILLADO VIGENCIA 2025 SEP – DIC		
ESTRUCTURA	CANTIDAD	TOTAL
SUMIDERO	116	560
CAJA DOMICILIARIA	53	
MANHOLL	391	
TUBERIA	20.919 m	20.919 m

Durante el periodo Septiembre – Diciembre del 2025 se ha realizado mantenimiento a **20.919 metros** lineales del sistema de **560 estructuras** alcantarillado y del sistema de alcantarillado

MANTENIMIENTO PTAP



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE POTABILIZACIÓN (MECANICOS, ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATADO: **\$600.000.000**

VALOR EJECUTADO: **\$600.000.000**

AVANCE: **100%**

PLAN DE MANTENIMIENTO BOCATOMA & PLANTA

2050

Actividades realizadas en los diferentes procesos unitarios

93,19%

CUMPLIMIENTO
ENE – DIC 2025




MANTENIMIENTO SUPERVISORIO PLANTA DE TRATAMIENTO:

Se realiza mantenimiento del Supervisorio el cual es el centro de mando del Operador, se realiza limpieza, ajustes, descargue de información.




PODA DE PUNTOS ELECTRICOS LINEA DE ENERGIA:

Se realiza poda de los arboles, ramas que se encuentran a la cercanía de la línea de 34500 Va desde el pórtico principal hasta la bocatoma.

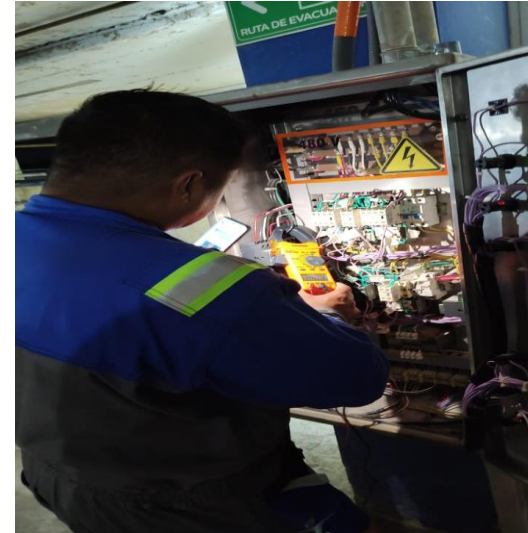

MANTENIMIENTO TABLEROS ELECTRICOS SULFATO GRANULADO.

Se realiza mantenimiento a los tableros que comprenden los equipos para la dosificación de los diferentes químicos usados para la potabilización del agua.

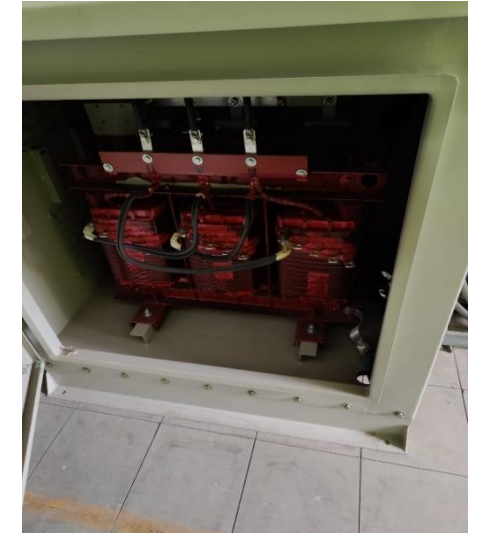

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR AREA ADMINISTRATIVA:

Se realiza limpieza en el área, revisión de mediciones, verificación de condición del equipo, con el fin de verificar su estado de funcionamiento.

NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO



USUARIOS NORMALIZADOS

156

255 CUENTAS NUEVAS CREADAS

MES	No CUENTAS CREADAS
1. SEPTIEMBRE 2025	28
CONEXIÓN	5
INDEPENDIZACIÓN	23
2. OCTUBRE 2025	46
CONEXIÓN	34
INDEPENDIZACIÓN	12
3. NOVIEMBRE 2025	141
CONEXIÓN	131
INDEPENDIZACIÓN	10
4. DICIEMBRE 2025	40
CONEXIÓN	14
INDEPENDIZACIÓN	26

Corte: Septiembre - Diciembre de 2025

CONTROL Y GESTIÓN EMPRESARIAL



INDICE DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REGALÍAS - IGPR

Proyectos Financiados con recursos del **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR** y seguimiento a través de la plataforma GESPROY-SGR, con cargue oportuno



Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. registra una **medición de desempeño de 86,7 puntos** en el componente de **seguimiento** y reporte oportuno de información en GESPROY, correspondiente al corte del **tercer trimestre de 2025**. Este resultado se ubica **por encima de la media nacional de 77,9 puntos**, lo que evidencia un cumplimiento destacado en la gestión de la información y en la transparencia de los procesos asociados a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

GESTIÓN DE PROYECTOS DE AC & ALC



15

PROYECTOS VIABILIZADOS

BANCO DE PROYECTOS AGUAS DE
BARRANCABERMEJA SA ESP

PROYECTOS VIABILIZADOS EN EL PERIODO DE SEPT A DIC DE 2025	
SECTOR ACUEDUCTO	3
SECTOR ALCANTARILLADO	9
SECTOR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3

GESTIÓN DE PROYECTOS DE ACUEDUCTO & ALCANTARILLADO

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	FUENTE DE RECURSOS	ESTADO
CONSTRUCCIÓN Y O REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y O PLUVIAL FASE 9:	\$3.411.898.651	RECURSOS PROPIOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA	TERMINADO
CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA – FASE 10“.	\$798.975.438	RECURSOS PROPIOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA	TERMINADO
REHABILITACION LINEA DE MEDIA TENSION PLANTA DE TRATAMIENTO – BOCATOMA FASE 3 – ADECUACION DE MEDICION INTERNA DE 34500VA CON NUEVOS CTS Y PTS, VARIADOR DE FRECUENCIA Y ARREGLOS SEGÚN NORMA	\$942.870.9510	RECURSOS PROPIOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN Y O REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y O PLUVIAL FASE 8 "CONSTRUCCION DESCOLE PLUVIAL EN LA CALLE 33 ENTRE CARRERA 38 Y BAJO EN EL BARRIO LOS PINOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”	\$298.627.499	RECURSOS PROPIOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN Y O REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y O PLUVIAL FASE 8 - CONSTRUCCION DESCOLE PLUVIAL EN LA CARRERA 64 CON CALLE 40A DEL BARRIO CAMPESTRE DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"	\$294.307.680	RECURSOS PROPIOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA	TERMINADO
REHABILITACION REDES DE ACUEDUCTO DE AC POR PVC LOCALIZADAS ENTRE CLL 52 ENTRE CARRERA 4/11, CRA 6 ENTRE LAS CLLES 52/49 Y CLL 49 ENTRE CRA 6/8 SECTOR COMERCIAL, COMUNA UNO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, FASE 1	\$ 2.521.504.071	RECURSOS PROPIOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA	EN EJEUCION

GESTIÓN DE PROYECTOS DE ACUEDUCTO & ALCANTARILLADO

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	FUENTE DE RECURSOS	ESTADO
CONSTRUCCIÓN DE LA RED MATRIZ (ANILLO HIDRAULICO), PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SECTOR HIDRÁULICO SUR DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA FASE I	\$14.362.733.910	POR GESTIONAR	GESTION DE RECURSOS MVCT
CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS YUMA Y BRISAS DE LA PAZ, COMUNA TRES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	\$4.707.801.318	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	EN EJECUCION
CONSTRUCCION COLECTOR Y ESTACION DE BOMBEO COVIBA DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	\$13.770.900.071	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	EN EJECUCION
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO PARA EL DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR SAN SILVESTRE, DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	\$3.409.911.513	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO 22 DE MARZO, COMUNA TRES DEL DISTRITO. FASE II BARRANCABERMEJA	\$10.999.988.396	POR GESTIONAR	GESTION DE RECURSOS DISTRITO
SUBSIDIO PARA LOS USUARIOS ESTRATOS 1 Y 2 DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	\$14.495.805.206	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	EN EJECUCIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS DE ACUEDUCTO & ALCANTARILLADO


NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	FUENTE DE RECURSOS	ESTADO
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIALES FASE 8: REHABILITACIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 50 CON CARRERA 13 DEL BARRIO COLOMBIA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-ABAL 037	\$109.964.596	RECURSOS PROPIOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA	TERMINADO
REHABILITACIÓN ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO POMARROSO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA ABAL039-AB089	\$2.655.426.300	RECURSOS PROPIOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIALES FASE 8: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CARRERA 36F ENTRE CALLES 60B Y 63 BARRIO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ABAL037	\$698.785.977	RECURSOS PROPIOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: URBANIZACION SAN SILVESTRE, VILLA LUISA I Y II, LOCALIZADOS EN LA COMUNA TRES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	\$1.098.106.772	PARA GESTIÓN DE RECURSOS	PARA GESTIÓN DE RECURSOS
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIALES FASE 8: CONSTRUCCIÓN DESCOLE PLUVIAL EN LA TRANSVERSAL 50 CON DIAGONAL 57A DEL BARRIO DANUBIO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA ABAL037	\$291.789.596	RECURSOS PROPIOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA	TERMINADO
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS MINIPTAR'S URBANAS Y DE LAS MINIPTAR'S Y PTAP RURALES DEL DISTRITO 2025 BARRANCABERMEJA	\$10.999.995.220	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	TERMINADO



SOSTENIBILIDAD FINANCIERA



ESTADO DE RESULTADOS



A corte del mes de diciembre de 2025, la Empresa presenta un resultado positivo de \$2.781.809.969,02

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (Expresado en pesos Colombianos)		
ACTIVO		
ACTIVOS	JULIO 2025	JULIO 2024
EFFECTIVO	10.589.069.676,61	6.172.262.115,77
DEUDORES	8.689.206.532,84	13.645.984.427,04
Servicios Públicos	22.206.156.307,13	19.217.200.656,90
Otros deudores	4.496.956.876,71	10.228.351.116,14
Deterioro de Deudores	-18.013.906.651,00	-15.799.567.346,00
INVENTARIOS	295.593.506,15	206.493.532,15
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28.956.031.741,27	29.615.011.523,27
OTROS ACTIVOS	4.588.379.134,50	4.486.704.401,95
TOTAL ACTIVOS	53.118.280.591,37	54.126.456.000,18
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR	17.192.143.627,24	20.469.398.735,90
OBLIGACIONES LABORALES	1.129.271.333,95	1.591.005.476,16
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.157.787.996,00	2.157.787.996,00
OTROS PASIVOS	8.314.916,60	59.311.043,56
TOTAL PASIVOS	20.487.517.873,79	24.277.503.251,62
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	29.848.952.748,56	27.118.851.802,00
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00	2.830.000.000,00
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	1.305.707.907,00
Reservas	15.631.939.885,71	12.901.838.939,05
Utilidad o Excedente Acumulados	10.081.304.955,85	10.081.304.955,95
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.781.809.969,02	2.730.100.946,56
TOTAL PATRIMONIO	32.630.762.717,58	29.848.952.748,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.118.280.591,37	54.126.456.000,18



COMPARATIVO
DICIEMBRE
2025 - 2024



USUARIOS POR SERVICIO DE ACUEDUCTO & ALCANTARILLADO

LOS **USUARIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO** DE DICIEMBRE DE 2025 CON RESPECTO A DICIEMBRE 2024

PERIODO	USUARIOS	VARIACIÓN
DIC '24	67.023	+0,6%
DIC '25	67.447	

LOS **USUARIOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO** DE DICIEMBRE DE 2025 CON RESPECTO A DICIEMBRE 2024

PERIODO	USUARIOS	VARIACIÓN
DIC '24	56.589	+0,5%
DIC '25	56.896	

El comportamiento de los Usuarios de Acueducto y Alcantarillado evidencia una leve tendencia de crecimiento: El aumento de **Usuarios de Acueducto** de 2024 a 2025 fue de **424**, pasando de 67.023 a 67.447 con una variación de +0,6%. El aumento de **Usuarios de Alcantarillado** de 2024 a 2025 fue de **307**, pasando de 56.589 a 56.896 con una variación de +0,5%.

USUARIOS BENEFICIADOS CON SUBSIDIO POR ESTRATO

BENEFICIADOS DE ACUEDUCTO

USO	DIC 2024	DIC 2025
RESIDENCIAL ESTRATO 1	24.265	25.681
RESIDENCIAL ESTRATO 2	19.900	19.764
RESIDENCIAL ESTRATO 3	8.827	0
TOTAL	52.992	45.445

Los Usuarios beneficiados de Subsidios de **Acueducto** (45.445) representan el 67,4% del total de Usuarios (67.447), con corte a Diciembre 31 de 2025.

BENEFICIADOS DE ALCANTARILLADO

USO	DIC 2024	DIC 2025
RESIDENCIAL ESTRATO 1	16.779	17.911
RESIDENCIAL ESTRATO 2	18.051	18.023
RESIDENCIAL ESTRATO 3	8.606	0
TOTAL	43.436	35.934

Los Usuarios beneficiados de Subsidios de **Alcantarillado** (35.934) representan el 63,2% del total de Usuarios (56.896), con corte a Diciembre 31 de 2025.



TARIFAS APLICADAS POR SERVICIOS

ACUEDUCTO		
Cargo Fijo		
Dic 2024	Dic 2025	Variación
\$8.530,46	\$9.087,50	6,53%

ALCANTARILLADO		
Cargo Fijo		
Dic 2024	Dic 2025	Variación
\$5.138,30	\$5.473,83	6,53%

ACUEDUCTO		
Valor Metro Cúbico Consumido		
Dic 2024	Dic 2025	Variación
\$2.253,62	\$2.461,28	9,21%

ALCANTARILLADO		
Valor Metro Cúbico Vertido		
Dic 2024	Dic 2025	Variación
\$1.908,49	\$2.054,41	7,65%

Se realizaron actualizaciones de tarifas para los Servicios de Acueducto y Alcantarillado en el Periodo Comercial de **Junio 2025**, en cumplimiento de los lineamientos del Artículo 125 de la Ley 142 de 1994, la Resolución CRA 943 de 2021 y demás normas concordantes. Desde el Periodo Comercial de Abril 2024 no se realizaban actualizaciones de tarifas.

COMPORTAMIENTO DE CARTERA

LA **CARTERA** A DICIEMBRE 2025 CON RESPECTO A DICIEMBRE 2024:

PERIODO	CARTERA	VARIACIÓN
DICIEMBRE 2024	\$ 19.217.200.657	15,55%
DICIEMBRE 2025	\$ 22.206.156.307	

Para el corte de la vigencia fiscal 2025, el valor de las cuentas por cobrar por servicios públicos correspondió a la suma de 22.206 Millones de pesos, lo que supone un incremento de 15.55% con respecto del año 2024; es importante precisar que a diciembre de 2025 está incluido el valor de los subsidios de Diciembre que quedaron pendiente por cobrar al Municipio de Barrancabermeja.



INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

EL **ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC)** DE
SEPT – DIC 2024 CON RESPECTO A SEPT – DIC 2025:

PERIODO	IANC	VARIACIÓN
SEP '24-DIC '24	66,5%	-3,0%
SEP '25-DIC '25	63,5%	

El **IANC** de **Septiembre-Diciembre 2025** alcanzó el **63,5%**, es decir que de cada 100 m³ producidos se facturan 37 m³. De esos 37 m³, los usuarios pagan el 75%, es decir, 27 m³. **En resumen, por cada 100 m³ producidos se recauda sólo por 27 m³; los restantes 73 m³ se convierten en agua perdida y/o cartera.**



CUMPLIMIENTO DE PAGO

AÑO	USUARIOS FACTURADOS		CUMPLIMIENTO DE PAGO USUARIOS FACTURADOS			
	ACU	ALC	PAGAN		NO PAGAN	
DICIEMBRE 2021	64.053	54.568	43.289	68%	20.764	32%
DICIEMBRE 2022	65.104	55.478	47.844	73%	17.260	27%
DICIEMBRE 2023	66.254	56.082	48.224	73%	18.030	27%
DICIEMBRE 2024	67.023	56.589	48.596	73%	18.427	27%
PROMEDIO 2021-2024			46.988	72%	18.620	28%
DICIEMBRE 2025	67.447	56.896	51.362	76%	16.085	24%
VARIACIÓN			+4.374		-2.535	
PROMEDIO 2021-2024 vs JULIO 2025			+9,3%		-13,6%	

Los **Usuarios que pagan** en promedio **2021-2024** fueron **46.988** y en **2025** fueron **51.362**, aumentando un 9,3%. Los **Usuarios que no pagan** en **2021-2024** fueron **18.620** y en **2025** fueron **16.085**, disminuyendo un 13,6%.





SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Gestión Ambiental



PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACION DE SUELO, FLORA Y FAUNA - PROGRAMA MIRS - CONSEJO DISTRICTAL DE RIESGO DE DESASTRES CDGRD

ACTIVIDADES	CANTIDAD
Mesa de trabajo del Plan de Acción Interinstitucional para la preservación, protección y conservación de las ciénagas Miramar, Juan Esteban, San Silvestre, el Llanito, ubicadas en el Distrito Especial de Barrancabermeja. Acción preventiva 145-2021	1
Participación de la socialización del Decreto 1553 de 2024, Actualización de la normativa sobre la Tasa Retributiva por vertimientos puntuales al agua en Colombia, - ANDESCO	1
Participación del Simulacro Nacional de respuesta a emergencia realizado el 22 de Octubre de 2025	1

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



Gestión Ambiental



PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA – PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PGA 2025-2028 – PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES PGRD-PEC.

ACTIVIDADES	CANTIDAD
Jornada de capacitación sobre el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, al personal de (INDERBA) y personal de la Aeronáutica Civil de Barrancabermeja	1
Jornadas de recolección de residuos aprovechables (papel-cartón-plástico – cartón - aceites usados), por parte de REDECOL	16

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



Gestión Ambiental



PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA – PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PGA 2025-2028 – PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES PGRD-PEC.

ACTIVIDADES	CANTIDAD
Participación de las reuniones lideradas por el Consejo Distrital de Gestión de riesgo de Desastres	2
Cumplimiento del 95% de las acciones adscritas en el Plan de Acción del Plan de Gestión ambiental vigencia 2025,	1
Participación de Comité Aviario	1
Participación capacitación Desarrollo de capacidades, en la elaboración del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con Enfoque de Derecho	1



ASEGURAMIENTO GRUPOS DE VALOR



RENDICIÓN DE CUENTAS – CONTROL SOCIAL Y MESAS DE DIALOGO



Sesión de Ediles y Lideres Comuna 7



Sesión de Ediles de la Comuna 2



Comunidad del Barrio 22 de marzo



Comunidad del Barrio Pablo Acuña



SENSIBILIZACIÓN – CUIDADO DEL ALCANTARILLADO



24-10-2025
Estudiantes del SENA



31-10-2025
Veedurías, Vocales de Control



04-11-2025
Estudiantes de UNITEC

PRENSA Y COMUNICACIONES



Logo of Barrancabermeja and Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.

Aguas Informa

¿Tienes dudas con tu factura?

Visítanos en nuestra **oficina comercial**
(frente a la Quinta del Parque Infantil)

Nuevo horario de atención

lunes a viernes

7:00 a. m. – 11:30 a. m.

2:00 p. m. – 6:00 p. m.

¡Te esperamos!

También puedes consultar a través de nuestro Chatbot

<http://www.aguasdebarrancabermeja.gov.co/>



20 años aguas de Barrancabermeja es de todos

¡20 años contigo y queremos premiarte!

TERCER SORTEO DE PAGADORES PUNTUALES

Participa en el sorteo de: Cabina de sonido con base, micrófono inalámbrico y control remoto.
Silla Gamer Olympe Roja.

Consulta términos y condiciones en:
www.aguasdebarrancabermeja.gov.co

Gracias a nuestra alianza con

Bestek+

Sorteo: 15 de octubre de 2025

Sorteo para usuarios de uso residencial con tres meses de pago continuo de su factura.

AUTORIZA SCOPD SOCIEDAD DE CAPITAL PÚBLICO DEPARTAMENTAL

CANALES DE INFORMACIÓN



[aguasdebarrancabermejagovco](https://www.facebook.com/aguasdebarrancabermejagovco)



[aguasdebarrancabermeja](https://www.instagram.com/aguasdebarrancabermeja)

CANALES DE INFORMACIÓN

Líneas de atención

333 602 5445

Extensión 1: atención al usuario

Extensión 2: línea de daños

Extensión 3: programación visitas técnicas

Línea atención de daños 24 horas:

324 588 4140
